

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019



3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019

Grundlage:

Stadtratsbeschluss v. 29.02.2016 zum
3. Kindertagesstättenausbaupaket
mit den entsprechenden
Standortfestlegungen

**Investitionsvolumen für
städtische Einrichtungen:**
(Neubauten, Provisorien)

ca. 31 Mio EUR

Gemeldete Bedarfe: Stadtteilbezogen insgesamt



- 48 neue Kita- Gruppen
(davon 26 Gruppen in städtischen
Einrichtungen)
- 14 neue Krippengruppen
(davon 9 Gruppen in städtischen
Einrichtungen)

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019

Projektstatus

Maßnahme:

Lichtenberger Ufer (8 Gruppen);
Ausweichquartier, Provisorium
für KTS-Süd Orffstraße

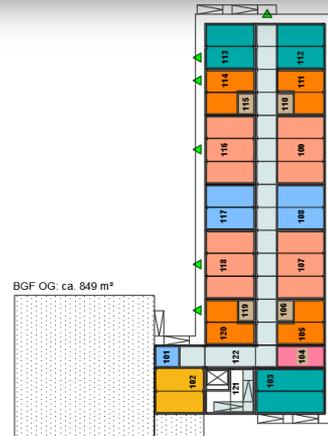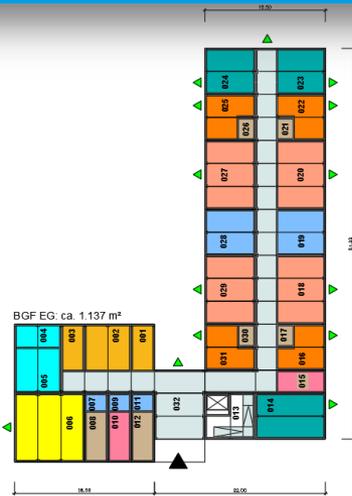


Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
<p>Ausführung: Die bauliche Anlage wurden komplett errichtet. Bau der Außenanlage ab Anfang April 2019</p>	<p>Maßnahme: Stadtrat 03.04.'17 Vergabe Bau: BGA 23.10.'17 geplante Baufertigstellung: Juni 2019</p>	<p>Beginn der Bearbeitung Ende Dezember 2018 (als alternative Projektentwicklung zum Standort Südwestknoten);</p>

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019

Projektstatus

Maßnahme:

Adolf-Diesterweg-Str.; Oggersheim
Neubau (7 Gruppen)

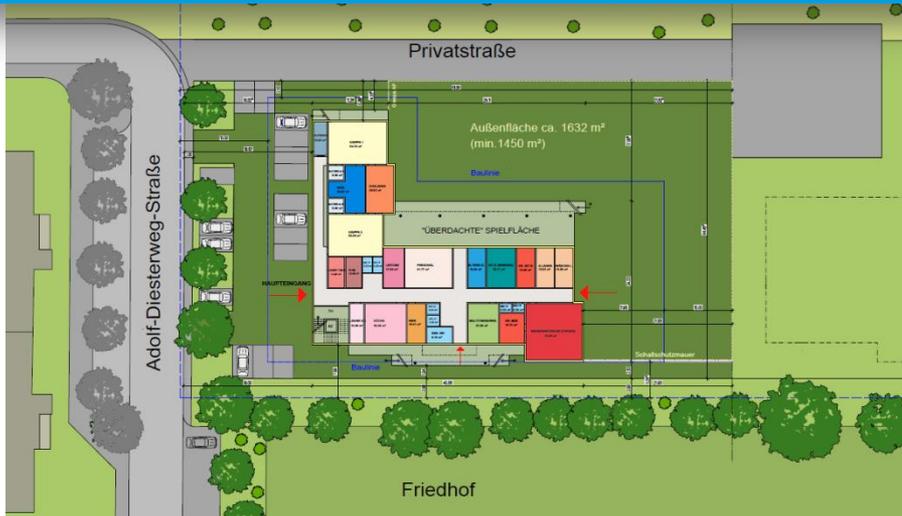




Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Ausschreibung gemäß Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ist erfolgt	Maßnahmeantrag: BGA 08.05.'17 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.'17 Vergabe Bau: BGA 01.04.2019 geplante Baufertigstellung: Ende 2021	keine

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019

Projektstatus

Maßnahme:

Orffstr. (8 Gruppen davon 5 Gruppen aus Bestand und 3 neue Gruppen)
Rückbau Bestand und Neubau

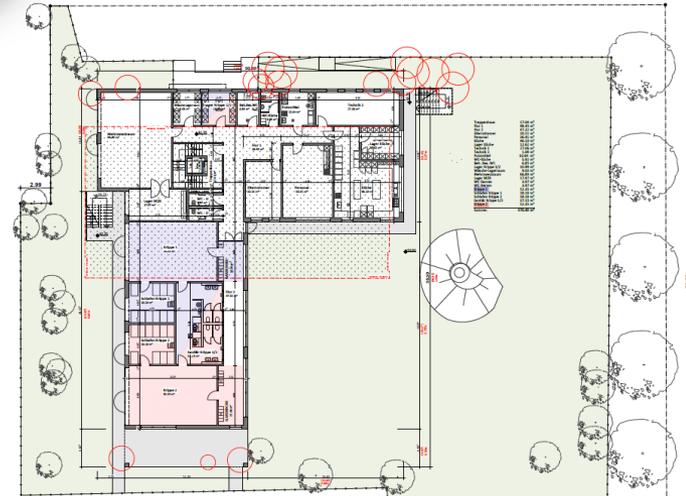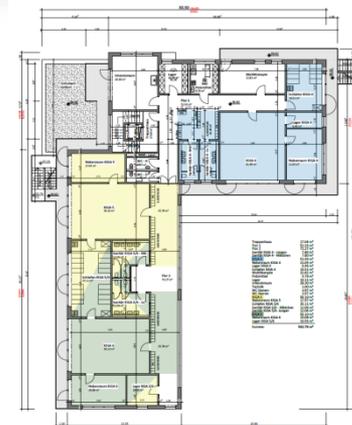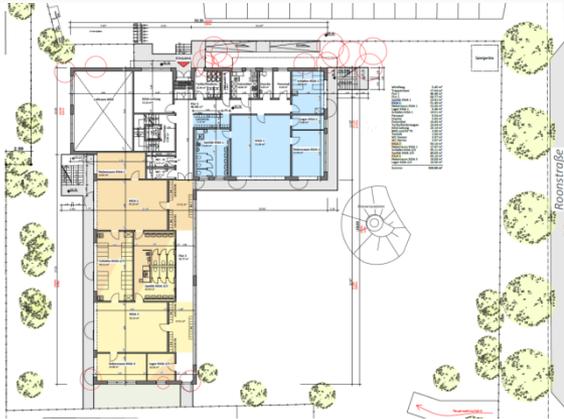

Bearbeitungsstand

Vergabe des Auftrages für die Errichtung der Kita gemäß Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm am 01.04.2019 im BGA

vorgesehene Rahmentermine

Maßnahmeantrag: BGA 08.05.'17
 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.'17
 Vergabe Bau: BGA 01.04.2019
 geplante Fertigstellung: Ende 2021

Direkte terminliche Abhängigkeit zur Fertigstellung des Ausweichquartiers!

Besonderheiten

Rückbau notwendig (Gründe: Kapazität, Konstruktion, Unwirtschaftlichkeit der Erweiterung, bzw. des Umbaus)
 Baumbestand soll erhalten bleiben.

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019

Projektstatus

Maßnahme:

August-Bebel-Straße; Oppau
Neubau (7 Gruppen davon 4 Gruppen
Bestand und 3 neue Gruppen)



Bearbeitungsstand

Vergabe des Auftrages für die Errichtung der Kita gemäß Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm am 01.04.2019 im BGA

vorgesehene Rahmentermine



Maßnahmeantrag: BGA 08.05.'17
Maßnahmebeschluss: StR 26.06.'17
Vergabe Bau: BGA 01.04.2019
geplante Baufertigstellung: Ende 2021

Besonderheiten

Rückbau Bestand notwendig (Gründe: Kapazität, Konstruktion, Unwirtschaftlichkeit der Erweiterung, bzw. des Umbaus) und erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus.

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019




Projektstatus
Maßnahme:
 Pettenkofersstraße
 Ausweichquartier (4 Gruppen für
 KTS-Schanzstr.)

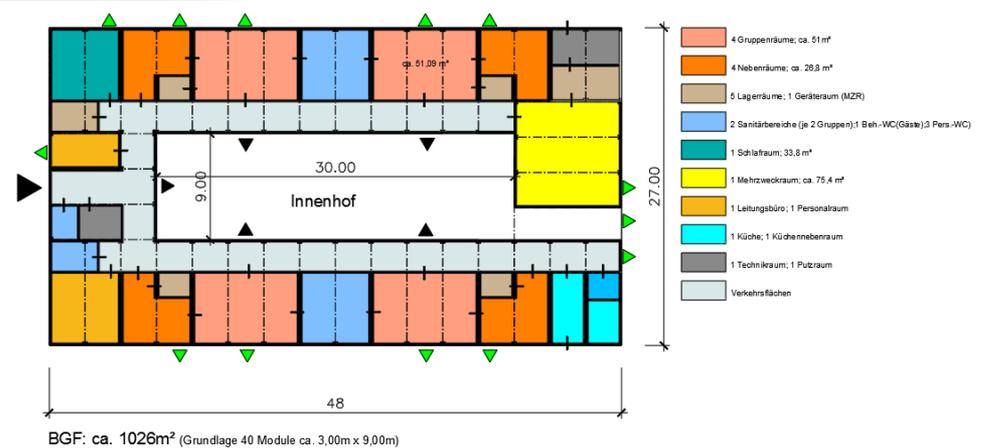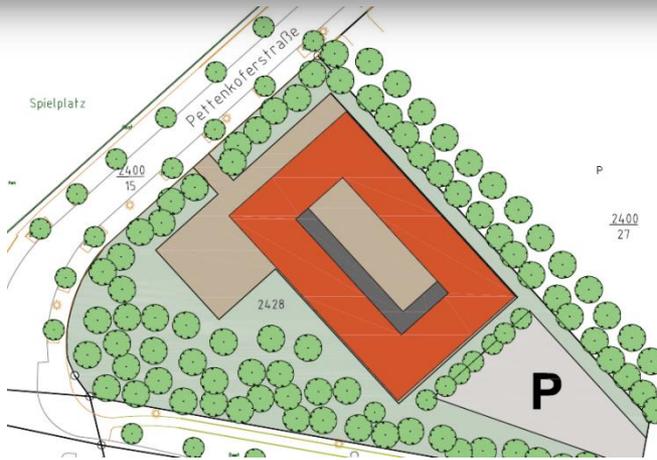

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Fertigstellung im März 2018 gemäß Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ist erfolgt	Maßnahmeantrag: BGA 05.09.'16 Vergabe Bau: BGA 12.06.'17 geplante Baufertigstellung: März 2018	Ausweichquartier für Maßnahme an der Schanzstraße.

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019


Projektstatus
Maßnahme:
 Schanzstraße
 Rückbau u. Neubau (7 Gruppen davon
 4 Gruppen Bestand und 3 neue Gruppen)

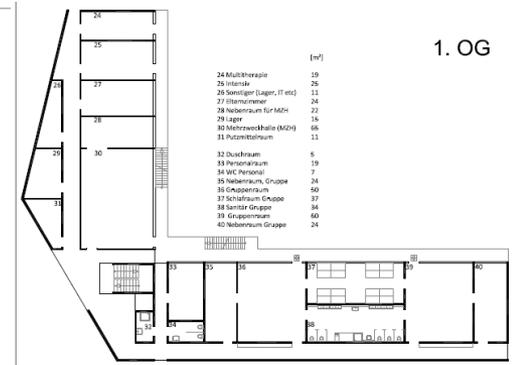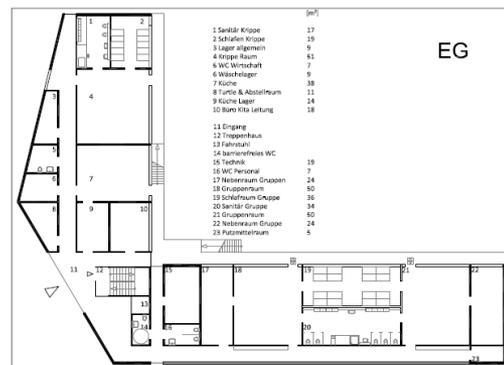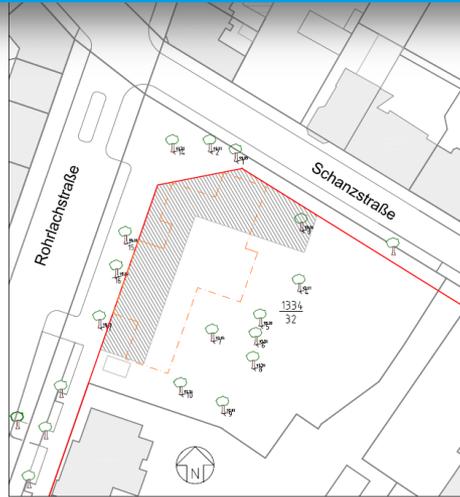

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
<p>Vergabe des Auftrages für die Errichtung der Kita gemäß Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm am 01.04.2019 im BGA</p>	<p>Maßnahmeantrag: BGA 08.05.'17 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.'17 Vergabe Bau: BGA 01.04.2019 geplante Baufertigstellung: Ende 2021</p> <p>Direkte terminliche Abhängigkeit zur Fertigstellung des Ausweichquartiers!</p>	<p>Rückbau Bestand notwendig (bestehendes Gebäude kann konstruktiv nicht umgebaut, bzw. erweitert werden)</p>

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019

Projektstatus
Maßnahme:
Berliner- Wörthstraße
Neubau (6 Gruppen)

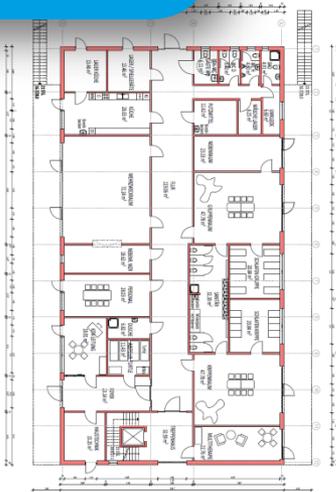


Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
<p>Vergabe des Auftrages für die Errichtung der Kita gemäß Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm am 01.04.2019 im BGA</p>	<p>Maßnahmeantrag: BGA 08.05.'17 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.'17 Vergabe Bau: BGA 1.04.2019 geplante Baufertigstellung: Ende 2021</p>	<p>keine</p>

3. KTS- Ausbauprogramm STATUS März 2019

Projektstatus
Maßnahme:
Mundenheim /Wattstraße;
Anmietung ext. Flächen (3 Gruppen)



Kindertagesstätte | Ludwigshafen - Wattstraße
Entwurf
M | 1:100

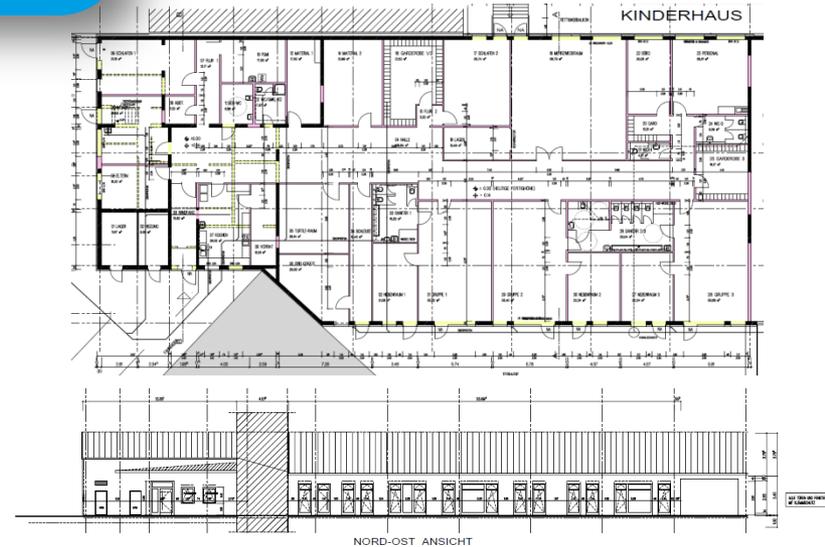

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Im Bau	Übergabe Juli 2019	
